

# WOZO Monitor

Ministerie van VWS

## Actielijn 1. Samen vitaal ouder worden

### Legenda

Planning

Afwijking van planning

Status kan niet worden beoordeeld

Conform planning

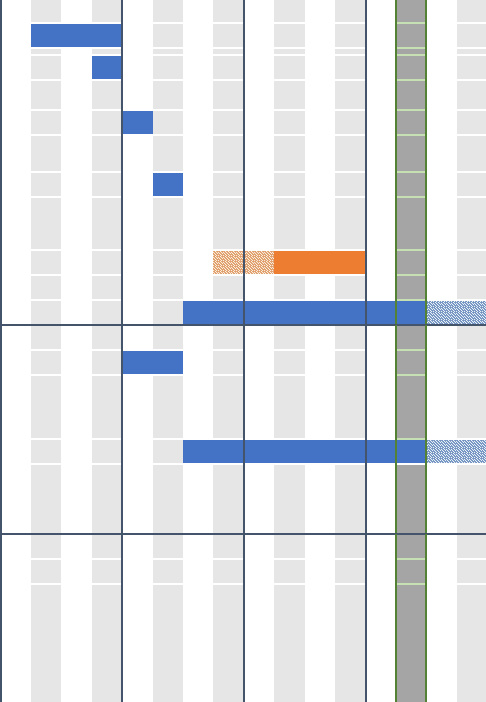
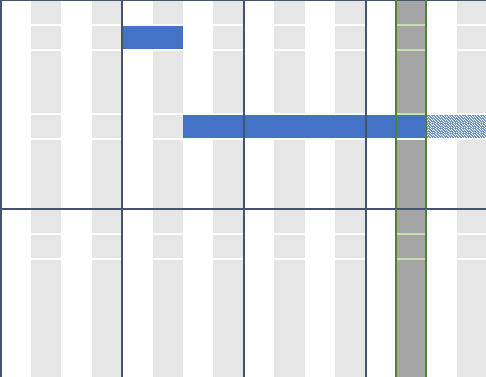

Conform planning

Afgerond anders dan gepland

Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning

Planning niet haalbaar en interventie benodigd

| DOEL ONDERWERP                                                                               | Jaar<br>Kwartaal | 2022 |   |   |   | 2023 |   |   |   | 2024 |   |   |   | 2025 |   |   |   | Stand van zaken                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                  | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 |                                                                                                                                                                             |
| <b>1 Voorbereiden op ouder worden</b>                                                        | ●                |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |                                                                                                                                                                             |
| Voorbereiden campagne 'praat vandaag over morgen'                                            |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | In 2020 is ActiZ gestart met de publiekscampagne "Praat vandaag over morgen". VWS is in gesprek met ActiZ over opschaling van publiekscampagne "Praat vandaag over morgen". |
| Ontwikkeling van campagne                                                                    |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Er worden communicatiemiddelen ontwikkeld om de campagne 'Praat vandaag over morgen' op te schalen.                                                                         |
| Start en uitrol van campagne                                                                 |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | De campagne wordt in 2025 voortgezet en uitgebreid met een aanpak die specifiek gericht is op het bereiken van mensen met een lage sociaal-economische positie.             |
| <b>2 Vitaal ouder worden - gezond leven</b>                                                  | ●                |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |                                                                                                                                                                             |
| Afspraak in GALA over: versterken uitvoering artikel 5a 'Ouderengezondheidszorg'             |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Begin 2024 wordt gestart met het onderzoek. Het onderzoek is opgelverd en wordt voor het eind van het jaar toegestuurd naar de Kamer.                                       |
| Afspraak in GALA over: gezonde voeding bij ouderen                                           |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Zie het GALA voor afspraken met gemeenten en zorgverzekeraars.                                                                                                              |
| Afspraak in GALA over: bewegen door ouderen                                                  |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Zie het GALA voor afspraken met gemeenten en zorgverzekeraars.                                                                                                              |
| Afspraak in GALA over: valpreventie bij ouderen                                              |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Zie het GALA voor afspraken met gemeenten en zorgverzekeraars.                                                                                                              |
| <b>3 Samen ouder worden</b>                                                                  | ●                |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |                                                                                                                                                                             |
| Programma voorstel 'samen ouder worden 2.0'                                                  |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Subsidieaanvraag Samen Ouder Worden 2.0 is ingediend en wordt behandeld. Voorbereiding voor het nieuwe programma zijn reeds gestart.                                        |
| Start vervolg programma                                                                      |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Subsidie verleend aan NOV.                                                                                                                                                  |
| <b>4 Intergenerationeel wonen</b>                                                            | ●                |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |                                                                                                                                                                             |
| Uitwerking stimuleringsregeling intergenerationeel wonen                                     |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Conceptversie voor subsidieregeling intergenerationeel wonen gereed.                                                                                                        |
| Start internet consultatie                                                                   |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Van 31 mei tot 23 juni stond de internetconsultatie subsidieregeling intergenerationeel wonen open.                                                                         |
| Openstelling regeling intergenerationeel wonen                                               |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Laatste subsidieronde van deze regeling is op 30 april 2025 gesloten.                                                                                                       |
| <b>5 Versterken van de ondersteuningsstructuur</b>                                           | ●                |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |                                                                                                                                                                             |
| Afspraak in GALA over versterken sociale basis                                               |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | In het GALA zijn met gemeenten afspraken gemaakt over het versterken van de sociale basis.                                                                                  |
| Gemeenten kunnen SPUK aanvragen                                                              |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Middels de brede SPUK hebben gemeenten middelen ontvangen voor het versterken van de sociale basis.                                                                         |
| Visie brief over de sociale basis (en een uitvoeringsagenda mantelzorg) naar de Tweede Kamer |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | De concrete aanpak over de sociale basis, inclusief een mantelzorgagenda, is in juli naar de Kamer verzonden.                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 Inzet op reablement</b><br>Kennisonwikkeling (ZonMw) en plan van aanpak opzetten<br>Oplevering onderzoeksrapport AEF in opdracht van VWS<br><br>Webinar reablement (georganiseerd met ActiZ, ZorgthuisNL en de VNG)<br><br>ZonMw Subsidieoproep doorontwikkelaars<br><br>ZonMw Subsidieoproep starters reablement<br><br>Uitvoering projecten |  |  | ZonMw programma "reablement" is begin 2023 gestart.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | AEF rapport is eind 2022 opgeleverd. Dit rapport werd goed ontvangen door veldpartijen.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | Webinar heeft plaatsgevonden en is goed bezocht.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | Beide subsidierondes zijn opengesteld, aanvragen zijn gehonoreerd en uitvoering van projecten is gestart.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | Projecten tweede ronde zijn toegekend. Volledige budget is benut.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | Gehonoreerde projecten zijn in uitvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>7 Innovatieve vormen van samenwerking</b><br>Kennisagenda 'versterking ondersteuning ouderen' opzetten voor de regionale werkplaatsen<br><br>Uivoering kennisagenda                                                                                                                                                                             |  |  | Subsidies zijn toegekend aan de 15 werkplaatsen Sociaal Domein en aan Movisie ter ondersteuning van associatie werkplaatsen Sociaal Domein.                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | De werkplaatsen hebben in samenwerking met hun partners een kennisagenda opgesteld die verder wordt uitgewerkt en uitgevoerd.                                                                                                                                                                                           |
| <b>8 Onderzoek naar de voorliggendheid van de Wlz</b><br>Mogelijk aanpassen van mogelijkheid om ondersteuning te weigeren als inwoners voldoen aan de Wlz-criteria.                                                                                                                                                                                | Herbeoordeling                                                                    |  | Deze activiteit staat tijdelijk on hold. Afweging hierbij is dat er vanuit meerdere trajecten, waaronder ook de GGZ in de Wlz, wordt nagedacht over de voorliggendheid van de Wlz op de Wmo. Er wordt daarom eerst afgewogen welke (samenhangende) aanpak het beste aansluit bij een onderzoek naar de voorliggendheid. |

### Legenda

## Planning

### Afwijking van planning

● Status kan niet worden beoordeeld

- Conform planning

- Conform planning

## Afgerond anders dan gepland

- **Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning**

- Planning niet haalbaar en interventie benodigd

| DOEL ONDERWERP |                                                                                                                                                | Jaar                  | 2022 |   |   |   | 2023 |   |   |   | 2024 |   |   |   | 2025 |   |   |   | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                | Kwartaal              | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1              | <b>Implementatie Handreiking Kwetsbare Ouderen Thuis</b><br>Herijking handreiking                                                              |                       |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Aan InEen is subsidie verleend om dit project te ondersteunen. De herijking is nu afgerond en per maart 2025 gepubliceerd, zie <a href="https://www.beteroud.nl/tips-tools/tools/handreiking-kwetsbare-ouderen-thuis-geactualiseerd">https://www.beteroud.nl/tips-tools/tools/handreiking-kwetsbare-ouderen-thuis-geactualiseerd</a> .                                                                                                                                                             |
|                | Bekostigingsadvies aan NZa                                                                                                                     |                       |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Bekostiging van coördinatie en afstemming in de eerste lijn is onderdeel van uitwerking van de Visie eerstelijnszorg 2030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Implementatie Handreiking                                                                                                                      |                       |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | De implementatie van de handreiking is gestart. De subsidie is per maart 2025 verleend. Veldpartijen hebben een plan uitgewerkt voor de verdere implementatie t/m 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2              | <b>Aanspreekbare- en herkenbare teams in de wijk (IZA)</b><br>Onderzoek RIVM naar ontwikkelingen op landelijk niveau                           |                       |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | RIVM heeft het eindrapport opgeleverd van het 3-jarige onderzoek naar de invulling van H&A-teams op landelijk niveau, zie <a href="https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2023-0469.pdf">https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2023-0469.pdf</a> .                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Passende bekostiging en inkoop voor aanspreekbare en herkenbare wijkverpleging                                                                 |                       |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Dit is per 1 januari 2024 geregeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3              | <b>Gezamenlijke triage- instrumenten voor kwetsbare oudere (IZA)</b><br>Herziening en verbreding van bestaande triage-instrumenten             | <b>Herbeoordeling</b> |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Er is geen actieve opvolging gegeven specifiek gericht op een herziening van triage-instrumenten. Wel zijn er in de realisatieagenda van de Visie eerstelijnszorg 2030 afspraken gemaakt over het ontsluiten van (triage)informatie vanuit de brede eerstelijnszorg op Thuisarts.nl. Daarnaast wordt een gezamenlijk model ontwikkeld voor vraagverheldering en toeleiding naar ondersteuning binnen of buiten de zorg voor aanbieders in de eerstelijns.                                          |
|                | Goede initiatieven op grote schaal bevorden                                                                                                    |                       |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4              | <b>Vereenvoudiging aanspraken van betaaltitels voor tijdelijk verblijf</b><br>In kaart brengen acties en gevolgen vereenvoudiging aanspraken   |                       |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | De NZa bracht op 15 februari 2024 een advies uit over de vereenvoudiging van de bekostiging van tijdelijk verblijf. Na dit advies is in Q1 2025 een aanwijzing naar de NZa verstuurd voor een experimentbekostiging binnen het tijdelijk verblijf en ambulante grz. Het experiment start op 1 januari 2026 en loopt tot 1 januari 2031. Daarnaast heeft VWS het Zorginstituut om advies gevraagd over de verduidelijking van de aanspraken in kortdurende zorg. Dit advies is recent gepubliceerd. |
|                |                                                                                                                                                |                       |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5              | <b>Definities van goede zorg voor eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen</b> |                       |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Vervolg geven aan Beter Thuis                                                                                                                  |                       |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | VWS heeft het programmavoorstel in januari 2024 goedgekeurd. De eerste subsidieronde/-oproep voor programmalijn 2 heeft al plaatsgevonden. Er wordt op termijn een nieuwe subsidieronde geopend voor programmalijn 1.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | Doorontwikkeling prestatiestructuur en tarifiering (ELV en SO)                                                                                 |                       |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | De aanwijzing voor het bekostigingsexperiment tijdelijk verblijf en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# WOZO Monitor

Ministerie van VWS

## Actielijn 3. Passende Wlz zora

### Legenda

Planning

Afwijking van planning

Status kan niet worden beoordeeld

Conform planning

Conform planning

Afgerond anders dan gepland

Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning

Planning niet haalbaar en interventie benodigd

| DOEL ONDERWERP                                            | Jaar<br>Kwartaal | 2022 |   |   |   | 2023 |   |   |   | 2024 |   |   |   | 2025 |   |   |   | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                  | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1 Scheiden van wonen en zorg</b>                       |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vaststellen 4800 onomkeerbare verpleeghuisplaatsen        |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | ZN heeft in 2024 de bouwplannen van de zorgaanbieders opnieuw beoordeeld aan de hand van de gestelde criteria. Het gaat hierbij om 5831 extra plaatsen.                                                                                |
| Opgave productieafspraken verpleeghuizen vpt/mpt/pgb 2023 |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Periodiek komt via de monitor langdurige zorg informatie beschikbaar over het door het zorgkantoor gecontracteerde aantal zzp's met verblijf, VPT, MPT en PGB.                                                                         |
| Inkoopafspraken ZN inkoopbeleid zorgkantoren 2024         |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Regiomonitor bouw verpleegzorgplaatsen 2023               |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | ZN heeft op 17 april 2025 de regiomonitor 2025 uitgebracht. Deze is anders van opzet en bevat de ontwikkeling van de Wlz-zorg (naar woonsetting) in de periode 2019-2024 en de bouwprognose tot en met 2030.                           |
| Visievorming m.b.t. onderscheid on-/geclusterde vpt       |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Scenario's over geclusterd versus ongeclusterd VPT vormen onderdeel van het nadenken over scenario's over de toekomst van de Wlz en zijn onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg, dat in het voorjaar van 2025 is afgesloten. |
| <b>2 Toegang tot aanspraak op verblijf</b>                |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opdracht aan ZIN                                          |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Het omslagpunt voor Wlz-zorg met verblijf is onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg dat in het voorjaar van 2025 is afgesloten.                                                                                              |
| <b>3 Inzet regiobudgetten</b>                             |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Regiobudget scheiden wonen en zorg                        |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Er zijn 2 budgetten die in de zorginkoop worden ingezet:<br>1) Regiobudget scheiden wonen en zorg<br>2) Stimuleringsbudget Wlz                                                                                                         |
| Stimuleringsbudget Wlz                                    |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | De uitgaven in het kader van het regiobudget en het stimuleringsbudget worden jaarlijks verantwoord.                                                                                                                                   |



## WOZO Monitor

Ministerie van VWS

### Actielijn 4. Wonen en zorg voor ouderen

#### Legenda

Planning

Afwijking van planning

Status kan niet worden beoordeeld

Conform planning

Conform planning

Afgerond anders dan gepland

Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning

Planning niet haalbaar en interventie benodigd

| DOEL | ONDERWERP                                                                                     | Jaar<br>Kwartaal | 2022 |   |   |   | 2023 |   |   |   | 2024 |   |   |   | 2025 |   |   |   | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                               |                  | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1    | <b>Versnelling woningbouw - Regie op ouderenhuisvesting</b>                                   |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Verdeling van regionale huisvestingsopgave voor ouderen per gemeente in regionale actietafels |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Alle regio's hebben afspraken over ouderenhuisvesting gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Inbedding bij het wetsvoorstel versterking regie op de ouderenhuisvesting                     |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Het wetsvoorstel Versterking regie op de volkshuisvesting is op 7 maart 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota n.a.v. verslag volgde op 17 april 2025. Verdere planning hangt af van de besluitvorming door de Tweede Kamer.                                                                                                             |
|      | Verbinding regionale woondeals met de volkshuisvestingsprogramma's                            |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | De opgave uit de regionale actietafels komt tot uiting in woonzorgvisies met bouwambities, die na regionale afstemming lokaal worden vastgesteld en in gemeentelijke volkshuisvestingsprogramma's opgenomen. De planning is gekoppeld aan de Wet versterking regie. Beoogd wordt dat gemeenten in 2026 volkshuisvestingsprogramma's hebben.   |
|      | Opstellen en organiseren kennistracten                                                        |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | De handreiking Zorggeschikte woningen (bedoeld voor professionals) is zomer 2024 gepubliceerd. De handreiking Wonen met een plus in bestaande bouw is in april 2025 verschenen. Opstellen en organiseren van kennistracten is een driejarig programma, met jaarlijks nieuwe projecten, waaronder congressen en delen van praktijkvoorbeelden. |
| 2    | <b>Versnelling woningbouw - Realisatie van verpleegzorgplekken</b>                            |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Stimuleringsregeling zorggeschikte woningen                                                   |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Bij de eerste tranche is tussen september 2024 en oktober 2025 voor €97 miljoen subsidie aangevraagd. De regeling is sinds 15 mei opnieuw open tot 28 november 2025, met €125 miljoen beschikbaar.                                                                                                                                            |
|      | Standaardisatietraject bouw verpleegzorgplekken                                               |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | ActiZ en Aedes leiden samen met het netwerk Conceptueel bouwen het onderzoek naar standaardisatie van zorggeschikte woonvormen. Onderzocht wordt onder meer of gekomen kan worden tot nieuwe productmarktcombinaties (PMC's). Het netwerk werkt aan standaardisering van zorggeschikte woningen, met oplevering verwacht in Q3 2025.          |
| 3    | <b>Ouderen informeren, ontzorgen en de doorstroming verbeteren</b>                            |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Doorstrooming betrekken bij volkshuisvestingsprogramma's                                      |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | In de volkshuisvestelijk programma's die op lokaal en regionaal niveau worden gesloten, wordt de inzet op doorstroming een vereiste. De initiële planning was om deze per januari 2024 rond te hebben en is bijgesteld naar januari 2026. De planning is gekoppeld aan het wetsvoorstel Versterking regie op de volkshuisvesting.             |
|      | Informatiecampagne over het toekomstbestendig wonen                                           |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | De minister van VRO werkt samen met andere partijen aan een (informatie)campagne met als doel om ouderen beter te informeren over passend wonen. Hierbij wordt aangesloten op campagne Praat Vandaag Over Morgen, die op 20 maart is gestart.                                                                                                 |
|      | Toolkit met algemene tools en beleidsinstrumenten                                             |                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | Platform31 heeft een toolkit met doorstromingsinstrumenten voor gemeenten                                                                                                                                                                                                                                                                     |

[illegible]

## Legenda

Planning

Afwijking van planning

Status kan niet worden beoordeeld

Conform planning

Conform planning

Afgerond anders dan gepland

Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning

Planning niet haalbaar en interventie benodigd

| DOEL | ONDERWERP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jaar<br>Kwartaal | 2022 |   |   |   | 2023 |   |   |   | 2024 |   |   |   | 2025 |   |   |   | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1    | <b>Ruimte voor behoud door goed werkgeverschap en werkplezier</b><br>Programma TAZ (professionele autonomie en zeggenschap, inwerken en begeleiding van nieuwe medewerkers, goede balans, gezonde en veilige werkomgeving)<br>Aanpassing Wet, kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor meer zeggenschap zorgmedewerkers<br>Via coaches van Waardigheid en Trots in de regio ondersteuning om in regionaal verband gezamenlijk te werken aan goed werkgeverschap<br><br>Stimuleringsbudget Wlz voor modern werkgeverschap | ●                |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | <p>Het programma TAZ is beëindigd. Het zorg- en welzijnsbrede arbeidsmarktbeleid krijgt vorm langs de lijnen die staan beschreven in het regeerprogramma.</p> <p>De aanpassing is op 1 juli 2023 in werking getreden.</p> <p>Dit is voortgezet onder de naam RegioKracht. Via RegioKracht bieden coaches ondersteuning om in regionaal verband gezamenlijk te werken aan goed werkgeverschap. Coaches zijn in 2022 gestart en worden tot en met 2026 ingezet. Regionaal goed werkgeverschap wordt verder financieel ondersteund met de regionale investeringsruimte (zie hieronder).</p> <p>Budget van jaarlijks € 30 miljoen is beschikbaar voor goed werkgeverschap en innovatie en technologie voor de periode 2022-2026. Er zijn inmiddels meer dan honderd projecten gericht op goed werkgeverschap gestart in de verpleegzorg. Ieder kwartaal starten nieuwe projecten.</p> |
| 2    | <b>Ruimte voor leren en ontwikkelen</b><br>Programma TAZ (voldoende instroom in de (vervolg)opleidingen, aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt en maatschappij, veilig en inspirerend leerklimaat, leven lang ontwikkelen)<br>Ondertekening investeringsakkoord opleiden wijkverpleging<br><br>Uitwerking investeringsakkoord opleiden wijkverpleging                                                                                                                                                                            | ●                |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | <p>Het programma TAZ is beëindigd. Het zorg- en welzijnsbrede arbeidsmarktbeleid krijgt vorm langs de lijnen die staan beschreven in het regeerprogramma.</p> <p>Met ActiZ, Zorgthuisnl, V&amp;VN en ZN is op 17 maart 2023 een akkoord ondertekend waarmee drie studiejaar geïnvesteed wordt in het meer samen en anders opleiden voor de wijkverpleging. Hier is eenmalig € 150 miljoen voor beschikbaar.</p> <p>De subsidieregeling Inrichten Opleidingsstructuur Wijkverpleging (IOW) ondersteunt vernieuwde opleidingsstructuren in de wijkverpleging. In 2025 en 2026 wordt de regeling Werkgeverskosten Opleiden Wijkverpleging (WOW) opengesteld (streven najaar 2025). Er is jaarlijks € 60 miljoen beschikbaar voor opleiding in de wijkverpleging.</p>                                                                                                                 |
| 3    | <b>Ruimte voor innovatieve werkvormen</b><br>Programma TAZ (inzet en opschaling van bewezen sociale- en technische innovaties, herijken van taken en functies, minder administratieve lasten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ●                |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | <p>Het programma TAZ is beëindigd. Het zorg- en welzijnsbrede arbeidsmarktbeleid krijgt vorm langs de lijnen die staan beschreven in het regeerprogramma.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4    | <b>Inzet digitale en hybride zorg</b><br>Opstellen clientreis<br><br>Opstellen menukaart voor bewezen effectieve (tijdbesparende) innovaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●                |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | <p>Er zijn drie cliëntreizen opgeleverd die inzicht geven in de meerwaarde van innovaties voor ouderen en hun omgeving gedurende de verschillende fases van ouder worden. De Tweede Kamer ontving de cliëntreizen in mei 2024. Ook zijn ze gebruikt voor verdere beleidsontwikkeling.</p> <p>De term 'menukaart' is niet meer gebruikt. In context van IZA-afspraken is via</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

Verbreding stimuleringsregeling E-health thuis (SET)

Via coaches van Waardigheid en Trots in de regio ondersteuning om in regionaal verband gezamenlijk te werken aan innovaties en inzet technologie

IOC-regeling (implementatie en opschalingscoaching) voor de ouderenzorg thuis

Via Zorg van Nu bewustwording van ouderen en mantelzorgers voor mogelijkheden van (zorg)technologie voor meer gemak/zelfstandigheid + zorgorganisaties ondersteunen bij implementatie

Via de Slimme Zorg Estafette organiseren tal van partijen uit verschillende zorgdomeinen activiteiten met als doel om van elkaar te leren en elkaar te inspireren

Versterken regionale innovatiehubs

Landelijk platform digitale zorg (nu nog kenniscentrum ZN) aan laten sluiten op zorg voor ouderen

Digitale en veranderkundige vaardigheden zorgmedewerkers stimuleren, onder meer via de coalitie Digivaardig in de Zorg

Verbeteren van digitale vaardigheden van burgers/senioren als randvoorwaarden om te kunnen profiteren van technologie in zorg en ondersteuning

In 2025 wordt de generieke module digitale zorg gehanteerd door

Digizo.nu gekozen in te zetten op een 'pas-toe-lijst' met digitale of hybride zorgprocessen. Met daarbinnen passende inzet van getoetste digitale/technologische innovaties. Begin 2024 publiceerde Digizo de eerste Transformatieagenda gepubliceerd, zie: <https://digizo.nu/methode/verzamen-en-prioriteren/transformatieagenda-digizo-nu/>. De transformatieagenda is de opmaat naar een 'pas-toe-lijst'.

In 2022 is de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heropend. Van de 300 projecten die uit de SET 2022-2023 zijn voortgekomen zijn er inmiddels 243 vastgesteld en moeten er nog 66 projecten worden afgerond in 2026.

Implementatie en opschaling digitale zorg loopt via de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg. Tranche 2024: 229 lopende projecten, 181 aanvragen in behandeling. Tranche 2025: 141 ingediende aanvragen, loket sluit op 30 september 2025. Het plafond is verhoogd van 27 mln naar 54 mln, maar de looptijd blijft tot eind 2029.

Dit is voortgezet onder de naam RegioKracht. Via RegioKracht bieden coaches ondersteuning om in regionaal verband gezamenlijk te werken aan dit thema. Coaches zijn in 2022 gestart, planning is dat ze tot en met 2026 ingezet gaan worden. Het wordt verder financieel ondersteund met de regionale investeringsruimte.

Zorgaanbieders huren via de IOC een coach in voor E-health opschalingsvraagstukken. In totaal zijn er 317 projecten uit vier rondes, waarvan 54 projecten uit de laatste ronde (eind 2024) nu nog beoordeeld worden. Deze lopen tot eind 2025 door.

Zorg van Nu heeft de Slimme Zorg van Nu Thuis e-learning gemaakt. Daarnaast advertenties bladen met voorbeelden van zorgtechnologie. Ook is de folder met voorbeelden van zorginnovaties weer verspreid bij 800 apotheken en 4400 huisartspraktijken.

In februari 2025 vond de vijfde editie van de jaarlijkse Slimme Zorg Estafette (SZE) plaats. In totaal zijn 155 activiteiten georganiseerd met in totaal 2.776 deelnemers. Er wordt geëvalueerd of en hoe de SZE in 2026 weer plaats zal vinden.

De verkenning over versterken van innovatiehubs is afgerond.

Het landelijk platform dat vanuit IZA is geïnitieerd onder de naam Digizo.nu richt zich primair op processen van IZA-partijen in de Zvw, maar situationeel ook vanuit Wlz en Wmo. Zie IZA en kolom financiering technologie voor meer informatie.

Ook in 2025 ondersteunt het kabinet samen met zorgbranches GGZ, huisartsenzorg, verpleging & thuiszorg, gehandicaptenzorg en algemene ziekenhuizen de Coalitie Digivaardig in de zorg. Deze coalitie zorgt voor meer bewustzijn voor de noodzaak van digitale vaardigheden bij medewerkers en helpt de juiste randvoorwaarden te creëren.

De kwartiermaker is in Q2 2025 gestart met 4 proeftuinen, die doorlopen tot eind 2025. De Stichting Helpdesk Digitale Zorg ontwikkelde een dashboard over knelpunten in digitale zorg, met onderzoek tot 2026. Pharos leverde producten op voor bewustwording, zoals de escapekoffer. Er is overleg over de voortzetting. De planning is eind 2027, omdat IZA-middelen tot dan doorlopen.

Terugkoppeling vindt plaats via IZA.

beroepsverenigingen bij alle nieuwe richtlijnen en kwaliteitsstandaarden en herijking van bestaande richtlijnen en standaarden en bekend bij patiënten/clienten en zorgverleners.

## 5 Financiering digitale en hybride zorg

Zorgaanbieders zetten meer in op gezamenlijk samenwerken en het inkopen van zorgtechnologie. VWS brengt huidige belemmeringen in kaart.

Vraagstukken rondom financiering en bekostiging van zorgtechnologie worden in kaart gebracht en indien mogelijk opgelost zodat zij geen belemmering meer vormen bij opschaling en borging in reguliere processen.

Het werken met dezelfde digitale toepassingen in de Wmo2015 en de Wlz wordt gestimuleerd, zodat de overgang voor cliënten en mantelzorgers soepel verloopt.

Bezien wordt op welke wijze cliënten hun digitale zorgtoepassingen kunnen meenemen naar het verpleeghuis.

Het zorgtransformatiemodel ZN en de ondersteuningsstructuur VWS wordt actief ingezet om de beweging naar een innovatie ecosysteem te maken en bewezen technologieën en zorgprocessen op te schalen.

Zorgkantoren pakken een stevigere rol om aanbieders met zorgtechnologie te laten werken. Hiervoor wordt het Wlz inkoopkader vanaf 2024 gebruikt en wordt door VWS waar nodig een bepaling toegevoegd in de Wlz.

Regionale investeringsruimte via de zorgkantoren - Stimuleringsbudget Wlz voor stimulans innovatie en technologie

Onderzoek of en hoe een zogeheten AMvB zorginkoop vastgesteld kan worden met daarin voorwaarden voor de wijze waarop zorgkantoren in hun zorginkoopbeleid en contractafspraken met aanbieders sturen op de inzet van technologie/innovaties

Meer concrete interventies benoemen in de inkoop (sluiten van de loop tussen kenniscentrum en zorginkoop). AMVB zorginkoop in de langdurige zorg en gesprek met verzekeraars/zorgkantoren over pas toe en leg uit

Per 2025 zijn er in de Zvw, Wlz en Wmo daar waar mogelijk en wenselijk prikkels en meer ruimte voor digitale zorg. Dit resulteert in meer inhoudelijke afspraken over meer inzet van digitale/hybride zorg waar wenselijk en mogelijk

Eind 2022 is door PwC het onderzoek "Eindrapport Centrale inkoop van digitale innovaties in de langdurige zorg - Verpleging & Verzorging" opgeleverd.

Begin 2023 leverde de NZa het onderzoek Bekostiging en financiering van zorgtechnologie in de verpleegzorg op. In april 2025 vroeg VWS de NZa om advies over een passende bekostiging voor de Wlz (verpleegzorg en gehandicaptenzorg) en de Zvw (wijkverpleging), om digitale zorg structureel in te zetten.

Hierover zijn gesprekken gevoerd met zorgaanbieders die hiermee bezig zijn en die meerwaarde zien om de uitdagingen die hierbij spelen in kaart te brengen. Hun input is onderdeel van het inmiddels afgeronde onderzoek naar het meenemen van digitale/hybride toepassingen over de domeinen heen dat PwC heeft uitgevoerd in opdracht van VWS (zie bijlage WOZO-brief december 2024).

Het eerder genoemde Digizo.nu maakt gebruik van het zorgtransformatiemodel en de ondersteuningsstructuur dat inmiddels doorontwikkeld wordt onder de naam Barrière Doorbrekers Initiatief. Zie IZA voor meer informatie.

Hierover zijn gesprekken geweest. Input zit waar mogelijk in inkoopkader.

Budget van jaarlijks 30 mln euro is beschikbaar voor de periode 2022-2026, gericht op innovatie en inzet technologie, maar ook voor goed werkgeverschap. Er zijn inmiddels meer dan honderd projecten gericht op innovatie en technologie gestart in de verpleegzorg. Ieder kwartaal starten nieuwe projecten.

Hierover zijn gesprekken geweest. Input zit waar mogelijk in inkoopkader.

Hierover zijn gesprekken geweest. Input zit waar mogelijk in inkoopkader.

Hierover zijn gesprekken over de Wlz geweest. Input zit waar mogelijk in inkoopkader. Voor de Wmo zijn er gesprekken gevoerd met de VNG. Zie IZA voor Zvw.
